


Anliegerinfo Nr. 5 vom 22.05.2018

Ausbau der Deisinger Straße in Pappenheim



Am vergangenen Donnerstag hat der Stadtrat vor der Stadtratsitzung die Baustelle, insbesondere die Pflasterarbeiten der Fahrbahnrandbegrenzung, besichtigt. Am Freitag wurde wie zugesichert der Asphalt im ersten Abschnitt eingebaut

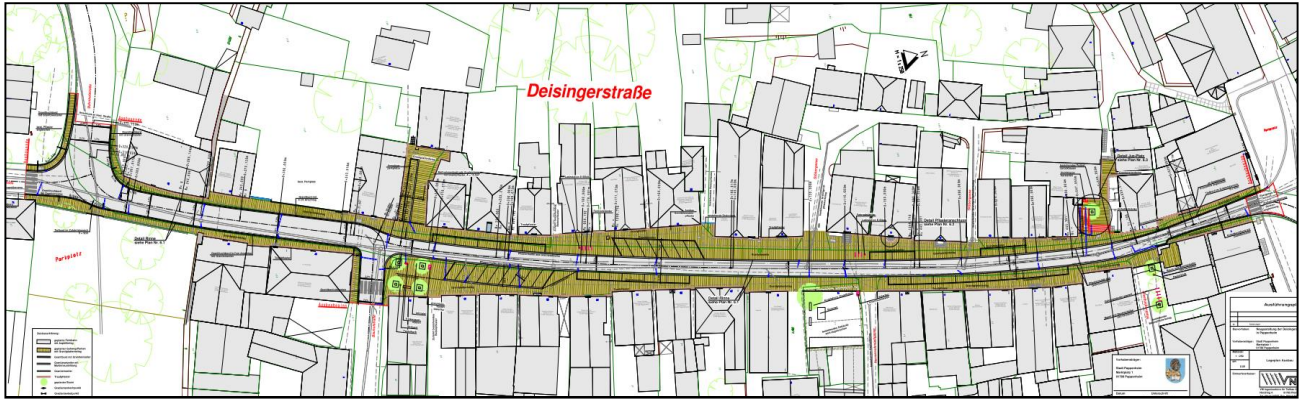



Ab morgen beginnen die Arbeiten zur Verlegung von Kabeln und Leerrohren im Bereich der hergestellten Asphalttragschicht. Die Erdarbeiten werden vorerst nicht nach Westen fortgeführt, so dass weiterhin die Anlieferung von Westen und über den Lämmermannplatz möglich ist.

**Mit freundlichen Grüßen
Ihre Bauleitung vom Ingenieurbüro VNI**

Versand über E-Mail Verteiler
