


# Anliegerinfo Nr. 7 vom 13.06.2018

## Ausbau der Deisinger Straße in Pappenheim



Auf der Westseite des ersten Bauabschnittes wurde mit dem Traufpflaster begonnen.

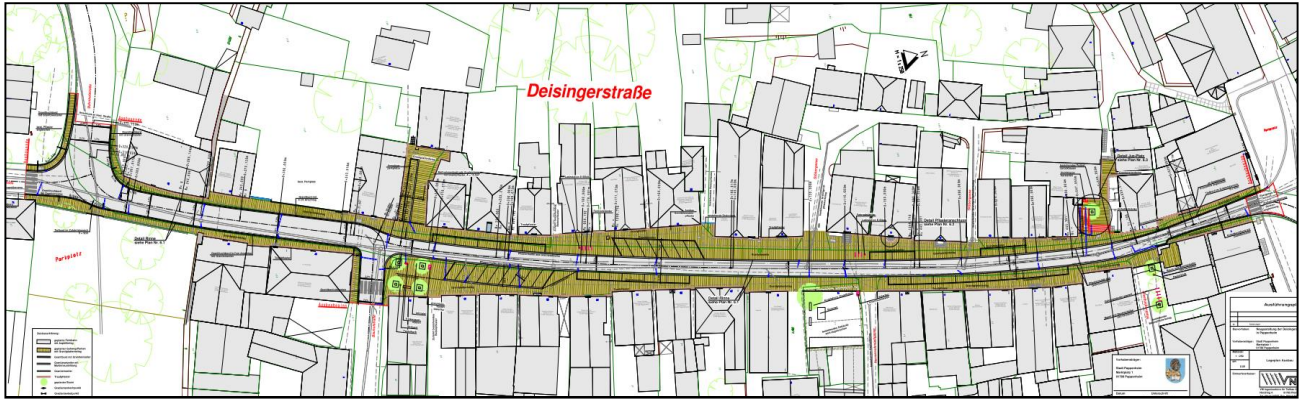



**Bis Anfang nächster Woche wird hier die Betontragschicht und anschließend der Granitplattenbelag hergestellt.**

**Die Zugänge zu den Anwesen erfolgen derzeit über die eingebaute Schottertragschicht.**



**Derzeit und auch in der nächsten Woche können einige Anwesen nur über Gehwegbrücken erreicht werden.**



**Die Erdarbeiten zur Herstellung von Stromkabeln und Leerrohren für Lichtwellenleiter konzentrieren sich auf die Ostseite.**





**Der Briefkasten ist zur besseren Erreichbarkeit zum Rathaus umgezogen**



**Sobald die Erdarbeiten im 1. Bauabschnitt beendet sind, werden sie im 2. Bauabschnitt fortgesetzt. Im ersten Bauabschnitt werden dann die Pflasterarbeiten auf der Westseite hergestellt.**

**Mit freundlichen Grüßen  
Ihre Bauleitung vom Ingenieurbüro VNI**

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'V' and 'N' followed by a smaller 'I'.

Versand über E-Mail Verteiler
