


Anliegerinfo Nr. 6 vom 30.05.2018

Ausbau der Deisinger Straße in Pappenheim



Am 16.05.2018 wurden durch Herrn Bamberger und Frau Kadlubeck vom Büro Bamberger Beleuchtungsproben mit den betroffenen Anliegern, Herrn Eberle, Architekt Frosch und Herrn Vulpius durchgeführt. Die Beleuchtungsproben lassen bereits jetzt die positiven Auswirkungen auf den Straßenraum der Deisinger Straße erahnen. Leider gab es auch Anlieger die einer Beleuchtung ihrer Gebäude ablehnend gegenüberstehen. Die Beleuchtungspläne wurden zwischenzeitlich aktualisiert

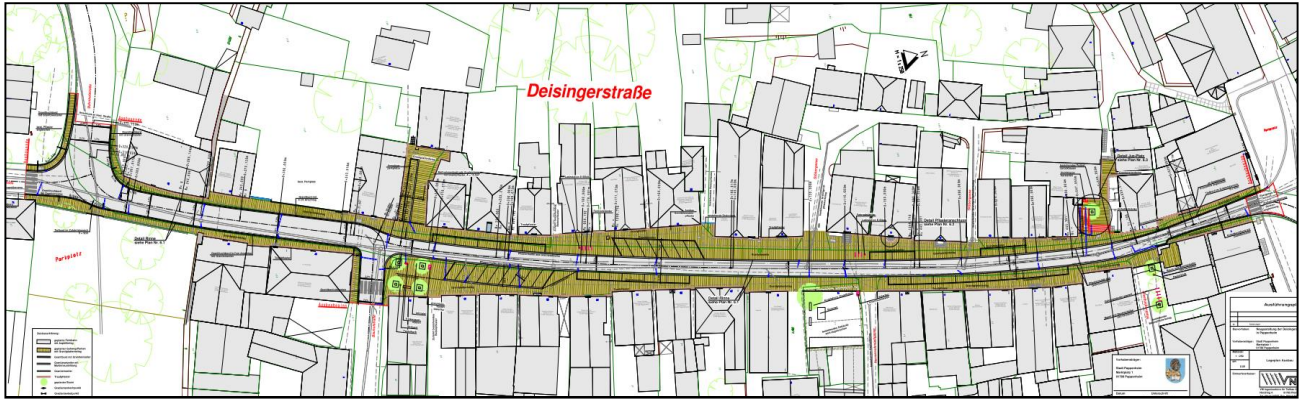

Bei einem Ortstermin mit Herrn Bamberger, Architekt Frosch, dem Inhaber der Elektrofirma Harvolk, den Stadtwerken und der Fa. Rossaro und Herrn Vulpius erfolgte die Einweisung zur Verlegung der Leitungen für die Beleuchtung.



Der asphaltierte Bereich der Fahrbahn wird trotz Sperrung häufig von Bürgern genutzt.



**Stellenweise sind die Ladengeschäfte im Westen des 1. Bauabschnittes zur Herstellung des Lichtwellenleiters vorübergehend nicht oder nur über Stege zu erreichen.
Die Abstimmung mit den betroffenen Ladeninhabern hat bisher vorbildlich geklappt.
An dieser Stelle sei dafür Dank ausgesprochen**





Nach dem Brückentag am Freitag, den 01.06.2018, an dem nicht gearbeitet wird, geht es am Montag weiter mit der Verlegung der Kabel und Leitungen und Herstellung der Schottertragschicht im Gehweg des westlichen Teil des BA1. Voraussichtlich übernächste Woche werden in diesem Bereich die Pflasterarbeiten mit der Herstellung des Traufpflasters beginnen und die Kabelverlegearbeiten an der Ostseite fortgeführt.

**Mit freundlichen Grüßen
Ihre Bauleitung vom Ingenieurbüro VNI**

Versand über E-Mail Verteiler
