


Anliegerinfo Nr. 7

Ausbau der Bauhofstraße in Pappenheim

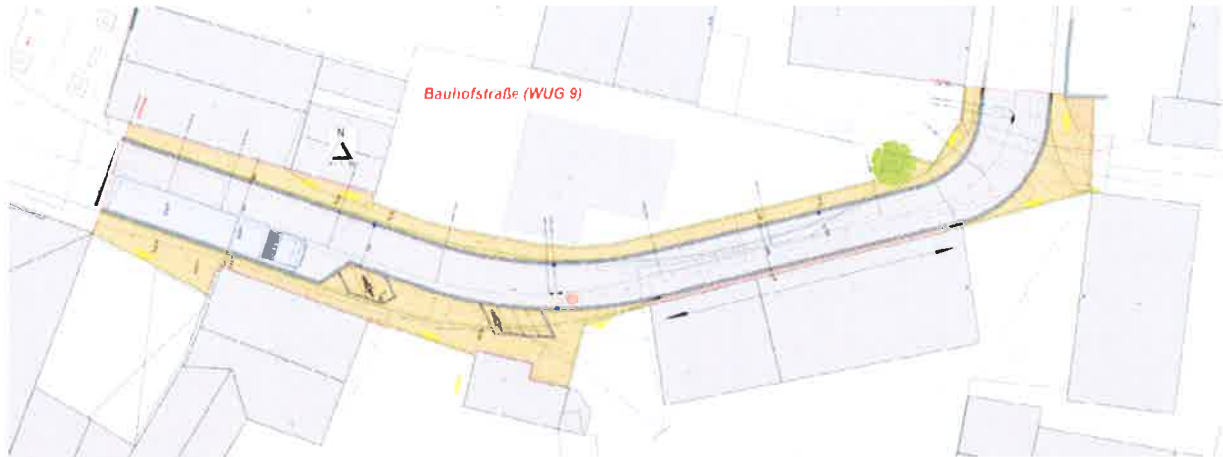

Bauhofstraße

Ausbau Bauhofstraße

Bis Freitag sind die Verlegearbeiten für die Versorgungsleitungen und Leerrohre im linksseitigen Gehweg abgeschlossen.





Ab der kommenden Woche erfolgen der Ausbau des rechtsseitigen Gehweges und die Herstellung der Kabelgräben für Leerrohre und Beleuchtung. Diese Arbeiten sollen bis Ende der 47. KW abgeschlossen sein.

Ab der 48. KW erfolgen der Einbau der Frostschutzschicht und die Vorarbeiten für die Herstellung der Bordbegrenzungen und Einzeiler aus Granitsteinen. Diese Arbeiten beginnen aus Richtung Deisigner Straße in Richtung Graf Carl Str.

Die Zufahrt zum Bauhof kann in dieser Zeit aus Richtung Graf-Carl Str. erfolgen.

Zufahrtsmöglichkeiten für erforderliche Anlieferungen sind wie bisher mit dem Polier der Firma Rossaro rechtzeitig, nach Möglichkeit 1 bis 2 Werktage vorher, vor Ort abzustimmen.

Mit freundlichen Grüßen

Ihre Bauleitung vom Ingenieurbüro VNI

12.11.2020

Versand über E-Mail Verteiler
